


附件1 公共工程施工進度管理作業流程圖

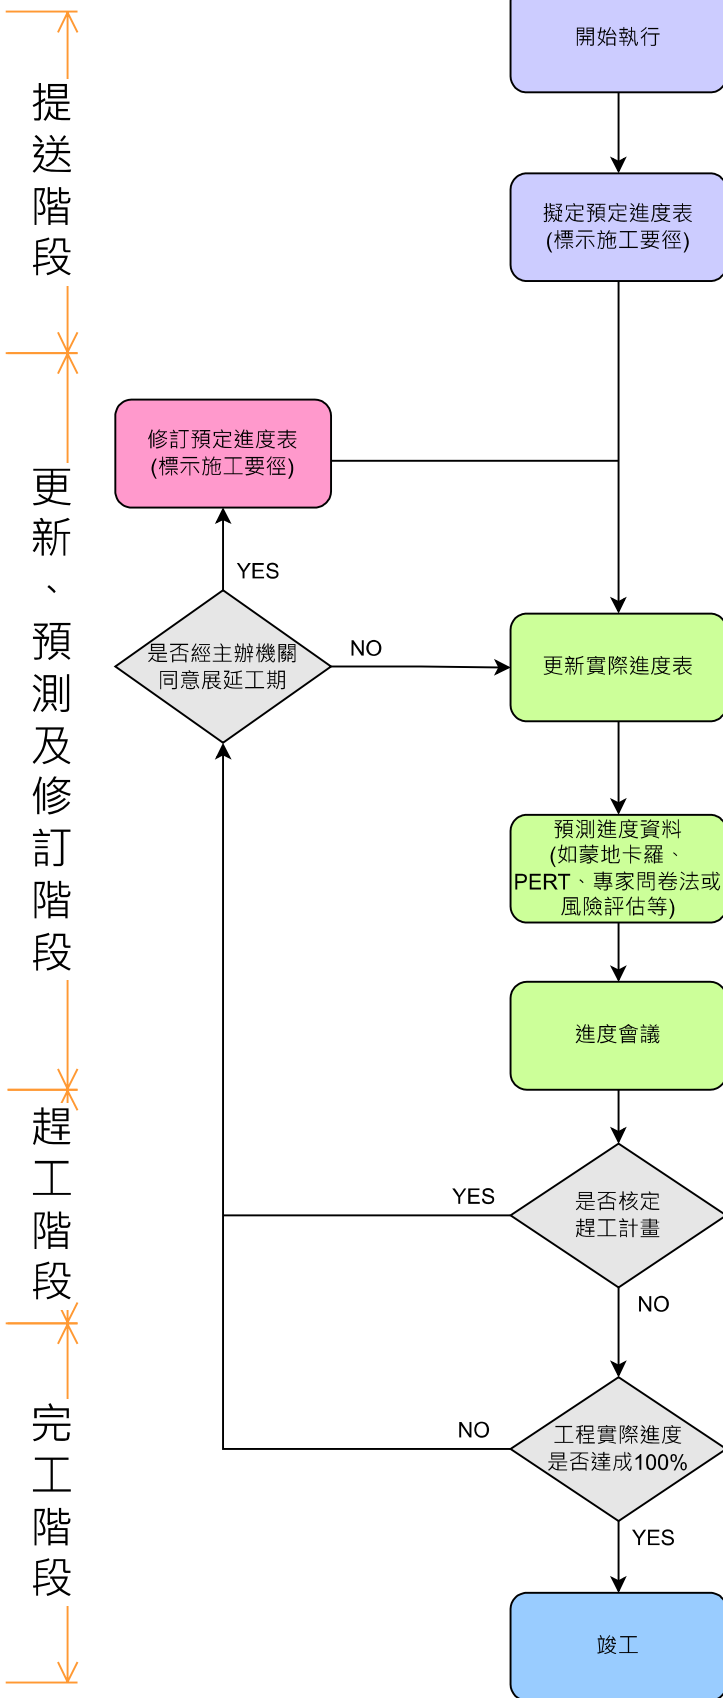

執行依據及參考規範

- 1. 工程採購契約範本：9(四)1.、3.、9(廿五) [附錄3] 3.3.5 (10)、10(三)3.
 - 2. 統包工程採購契約範本：9(九)1.、3.、10(三)3.
 - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件1] 二(三)1.(3)、3. (1)、4. (1)、2 [附件2] 二(三)3.
 - 4. 公共工程專案管理契約範本：2 [附件] 五(二)、(六)
 - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程開(施)工前2.
 - 6. 監造計畫製作綱要：第四章4.表4.1項次四
-
- 1. 工程採購契約範本：7(三)1.、9(廿五) [附錄3] 3.3.5 (7)
 - 2. 統包工程採購契約範本：7(三)1、9(廿九) [附錄3] 3.3.5(7)
 - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件1] 二(三)1.(3)、3. (1)、4. (1)、2 [附件2] 二(三)3
 - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六(四)、(五)
 - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段20.
-
- 1. 工程採購契約範本：5(一)2.(1) [公共工程估驗付款作業程序] 三(一)6.、9(廿五) [附錄3] 3.3.5(4)、(9)
 - 2. 統包工程採購契約範本：9(廿九) [附錄3] 3.3.5(4)、(9)
 - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件1] 1. (6)、4 (4)、2 [附件2] 二(三)8.
 - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六(四)、(五)
 - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段17.
 - 6. 公共工程估驗付款作業程序：三(一)6.
-
- 1. 工程採購契約範本：9(廿五) [附錄3] 3.3.5(8)
 - 2. 統包工程採購契約範本：9(廿九) [附錄3] 3.3.5(8)
 - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件1] 二(三)1.(3)、3. (1)、4. (1)、2 [附件2] 二(三)3.
 - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六(三)
 - 5. 公共工程施工階段契約約定權責分工表：工程施工階段17.
-
- 1. 工程採購契約範本：9(廿五) [附錄3] 3.3
-
- 1. 工程採購契約範本：5(一)5.(1)
 - 2. 統包工程採購契約範本：5(一)6. (1)
 - 3. 公共工程技術服務契約範本：2 [附件1] 二(三)1.(3)、3. (1)、4. (1)、2 [附件2] 二(三)3.
 - 4. 公共工程專案管理契約範本：8 六(一)6.
 - 5. 公共工程廠商延誤履約進度處理要點：五
 - 6. 公共工程趕工實施要點：二

↑ 提送階段

更新、預測及修訂階段

趕工階段

完工階段 ↓
